

# ◇広島駅南口整備 工事だより◇

## 広島駅南口広場の再整備等における駅前大橋線橋りょう等新設工事

# 2024年8月

広島電鉄(株) 駅前プロジェクト推進部



【みなさまへ】  
 平素から本事業にご協力を頂き、ありがとうございます。  
 当月の工事予定と合わせて工事の状況をみなさまにお知らせしています。  
 騒音にも十分に留意し、様々な対策を講じた上で安全第一で工事を進めてまいりますので、引き続きご理解とご協力のほど宜しくお願い致します。

**現場状況** 路面電車は、駅前大橋南詰から高架で広島駅2階に乗入れます。  
 現在は駅前大橋の電車専用橋の架設作業を行っております。その他高架区間についても、今月より順次工事を進めていきます。  
 Cブロック(蔦屋家電周辺)では、橋桁の架設が完了し現在塗装作業等を行っております。

### 駅前周辺 及び 駅前通り

駅前周辺 (旧バスエリア)



旧バスエリアを解体し、次工程へ進めています

駅前通り (駅前大橋)



桁架設(電車専用橋 駅方面(上り側) 桁組立作業

駅前通り (駅前大橋)



桁架設(電車専用橋) 中床版(中央部)の組立作業

松川町～比治山町交差点



軌道の新設作業を行っています


比治山町交差点では、夜間に於いて軌道工事を開始しました。  
 たわみ軌道化→4線化(軌道切替)→軌道ブロック化と夜間作業で工事を進め、今年度中に比治山町交差点の施工が完了する予定です。  
 今後も交通規制や騒音等でご迷惑をお掛けしますが、ご協力の程よろしくお願いたします

## 現場から一言

### 駅前大橋 電車専用橋の桁架設 施工順序図

現在、駅前大橋の電車専用橋の桁架設作業を行っております。  
 今秋には橋梁が完成する予定です。


駅前大橋 路面電車専用橋 長さ約74.5m 幅約7.8m 重さ約263t

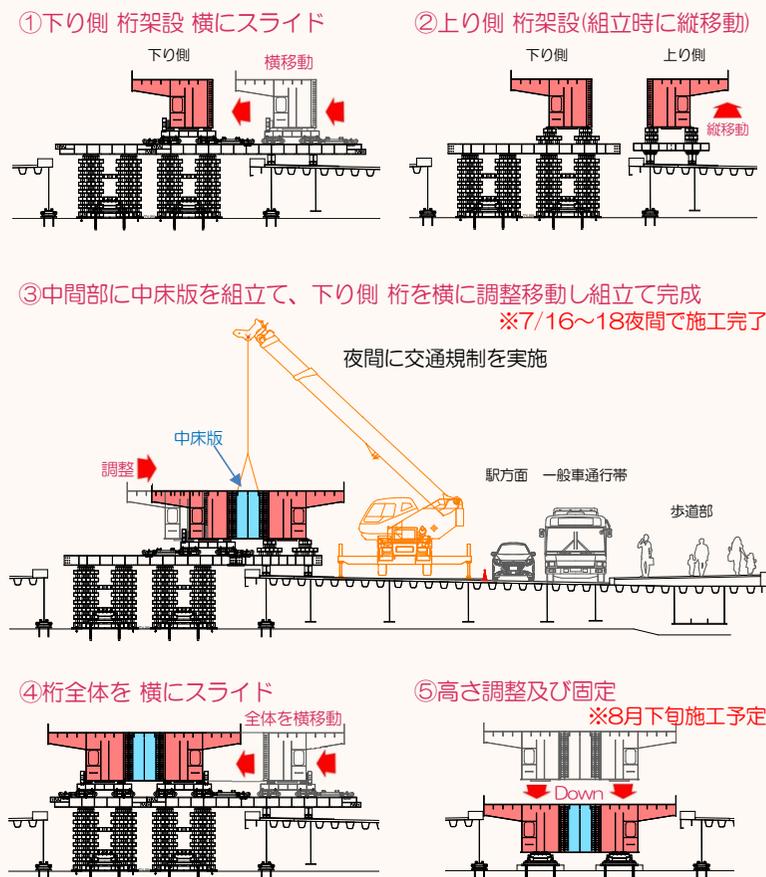

■広島駅南口広場の再整備等における駅前大橋線橋りょう等新設工事  
 広島電鉄(株) 電車事業本部 駅前プロジェクト推進部  
 (施工者:大林組・広電建設・広成建設 広島広島駅共同企業体)


# 工事場所

地上部 平面図

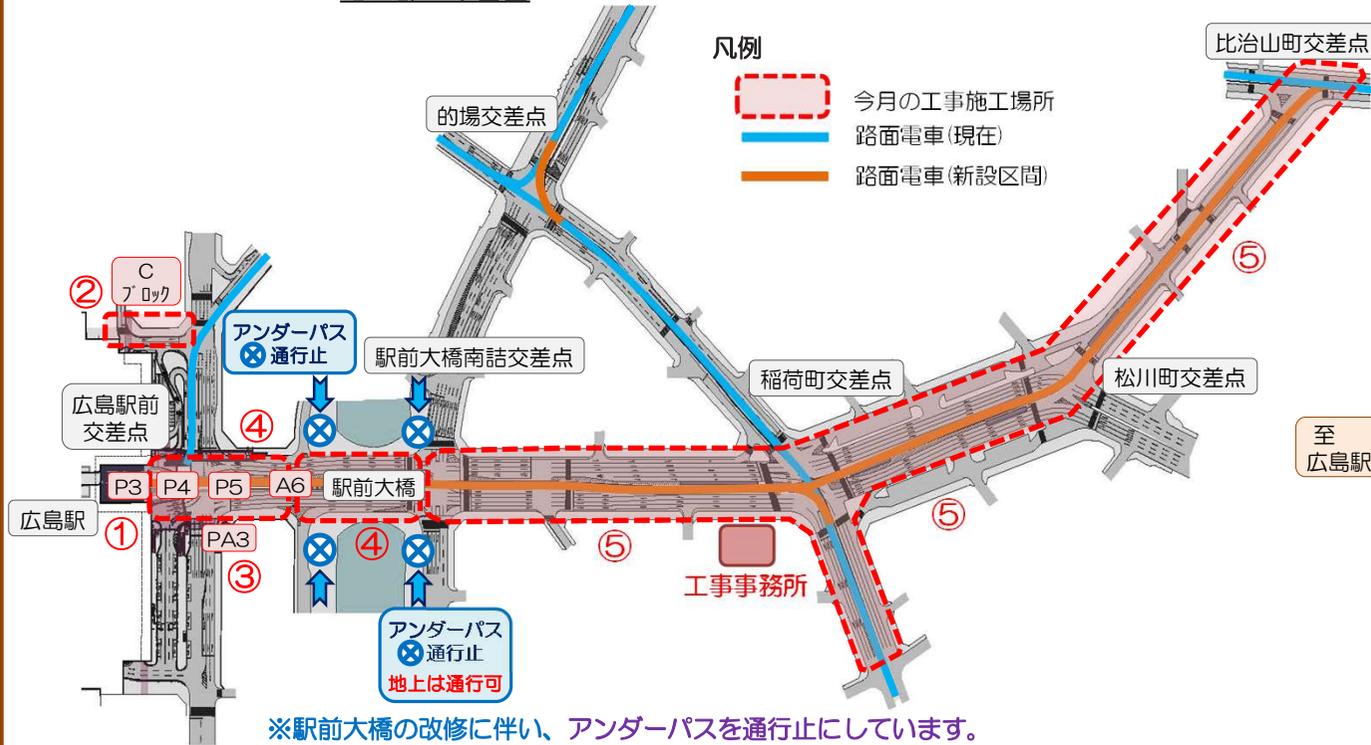

※駅前大橋の改修に伴い、アンダーパスを通行止にしています。ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。

地下部 平面図 (地下広場)

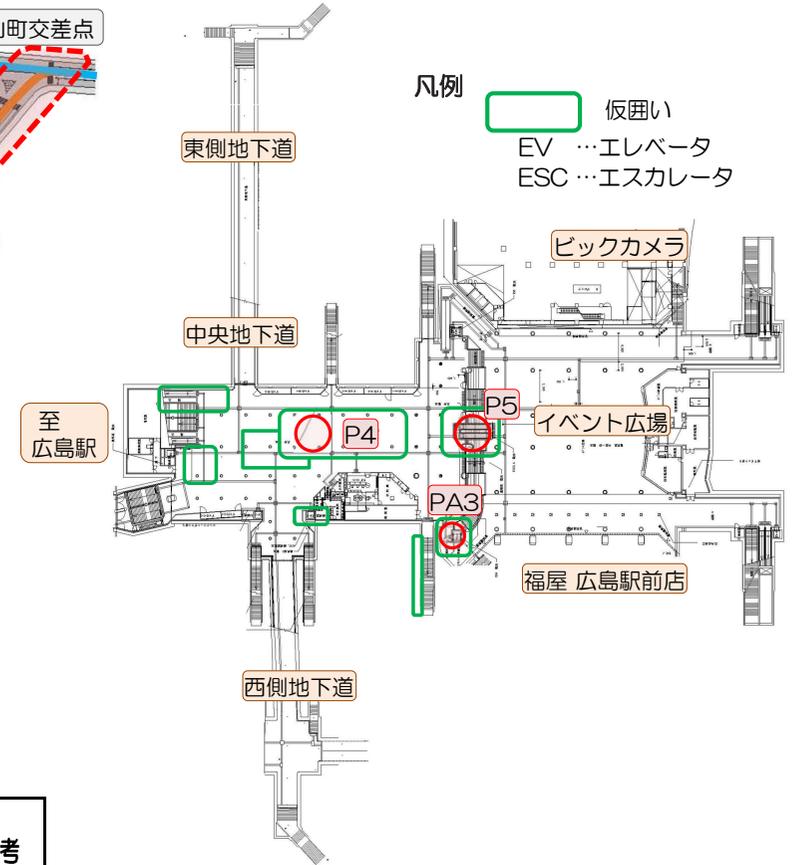

エレベータ停止や仮囲い増設に伴い、大変ご迷惑をお掛けしておりますが、ご協力の程よろしくお願いいたします。

# 工程表

工事内容	7月		2024年8月							9月		備考
	26	31	1	5	10	15	20	25	31	1	5	
① 駅地上部(旧バスター) 地下広場他	■		■							■		
② Cブロック (歩道橋他)	■		■							■		
③ PA3(福屋北東部)	■		■							■		
④ P4橋脚~A6橋台間 駅前大橋改修	■		■							■		
⑤ 軌道工事他	■		■							■		

凡例

- 昼間作業
- 夜間作業

※①可能な限り昼間に行いますが、一般交通の通行等に支障を来たす場合は夜間に行います。  
 ②通行止が必要な作業は夜間、騒音が発生する作業は可能な限り昼間に行います。  
 ③交通規制が必要な場合は夜間に行います。  
 ④駅前大橋は、橋桁の架設を順次進めています。交通規制が必要な場合は夜間に行います。  
 ⑤軌道工事他は、昼夜に行います。  
 車線規制が必要な作業は夜間、騒音が発生する作業は可能な限り昼間に行います。

# 広島駅南口広場の再整備等 推進協議会

