

# ◇広島駅南口整備 工事だより◇

## 広島駅南口広場の再整備等における駅前大橋線橋りょう等新設工事

# 2024年9月

PARSES  
HIROSHIMA STATION  
広島駅南口広場の再整備等推進部

## 広島電鉄(株) 駅前プロジェクト推進部

【みなさまへ】  
平素から本事業にご協力を頂き、ありがとうございます。  
当月の工事予定と合わせて工事の状況をみなさまにお知らせしています。  
騒音にも十分に留意し、様々な対策を講じた上で安全第一で工事を進めてまいりますので、引き続きご理解とご協力のほど宜しくお願い致します。

### 現場状況

路面電車は、駅前大橋南詰から高架で広島駅2階に乗入れます。  
現在は大州通りの高架桁の架設が完了し、駅前大橋の電車専用橋の架設作業を行っております。  
また、駅前大橋南詰～稲荷町～松川町～比治山町交差点間までの車道中央部分を交通規制し、軌道工事を順次進めております。

### 駅前周辺 及び 駅前通り

駅前周辺 Cブロック



橋桁の足場を解体し、手摺等を整備していきます

駅前通り (駅前～駅前大橋間)



擁壁(構造物)のコンクリート打設を行っています

比治山町4番北～比治山町交差点



軌道の新設作業を行っています

比治山町交差点 周辺



軌道の新設(分岐部)の準備作業を行っています

駅前大橋では桁架設作業が終盤に差し掛かっています。今後、高さ調整及び電車設備・高欄等の整備を順次行っていきます。  
今後交通規制や騒音等でご迷惑をお掛けしますが、ご協力の程よろしくお願いたします。

### 現場から一言

#### 小学生親子を対象に現場見学会を開催！

8月24日(土)、広島駅南口の路面電車の新ルート『駅前大橋線』の工事現場を広島市・広島電鉄(株)・JR西日本主催で親子66組188名に一般公開しました。  
広島の新たな玄関口となる南口では、完成に向けて着々と工事を進めています。



クレーン車の操縦席に試乗し、現場の雰囲気を感じてもらいました。


工事について現場担当者からの説明をみなさん熱心に聞いてくれました。



■広島駅南口広場の再整備等における駅前大橋線橋りょう等新設工事  
広島電鉄(株) 電車事業本部 駅前プロジェクト推進部  
(施工者：大林組・広電建設・広成建設 広電広島駅共同企業体)


# 工事場所

## 地上部 平面図

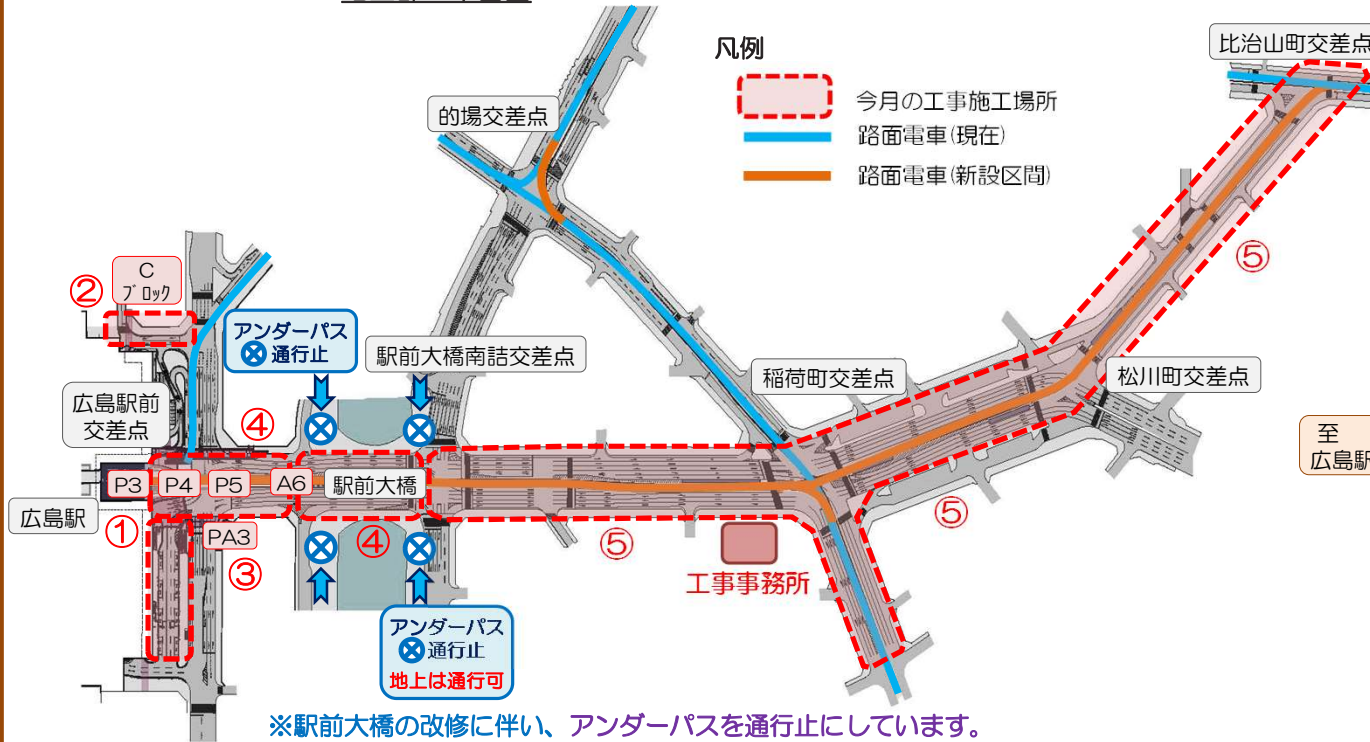

※駅前大橋の改修に伴い、アンダーパスを通行止にしています。ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。

## 地下部 平面図 (地下広場)

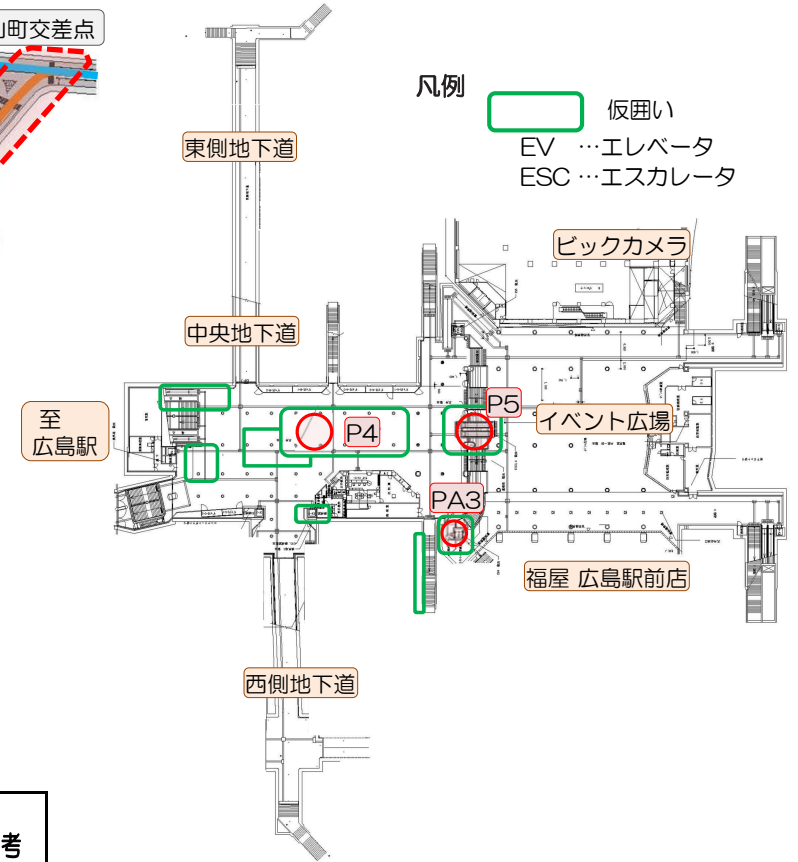

エレベータ停止や仮囲い増設に伴い、大変ご迷惑をお掛けしておりますが、ご協力の程よろしくお願いいたします。

# 工程表

工事内容	8月		2024年9月								10月		備考
	26	31	1	5	10	15	20	25	30	1	5		
① 駅地上部(旧バスエリア) 地下広場他	■		■		■								
② Cブロック (歩道橋他)	■		■										
③ PA3(福屋北東部)			■ エールエール館 建物側工事中										
④ P4橋脚~A6橋台間 駅前大橋改修	■		■		■								
⑤ 軌道工事他	■		■										

## 凡例

- 昼間作業
- 夜間作業

※①可能な限り昼間に行いますが、一般交通・路面電車の通行等に支障を来たす場合は夜間に行います。  
 ②通行止が必要な作業は夜間、騒音が発生する作業は可能な限り昼間に行います。  
 ③交通規制が必要な場合は夜間に行います。  
 ④駅前大橋は、橋桁の架設を順次進めています。交通規制が必要な場合は夜間に行います。  
 ⑤軌道工事他は、昼夜に行います。  
 車線規制が必要な作業は夜間、騒音が発生する作業は可能な限り昼間に行います。

## 広島駅南口広場の再整備等 推進協議会

